





LICITACIÓN PÚBLICA N° 014/2016




"SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MATERIAL DE FIBRA OPTICA DD y ADD"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 29/02/2016 HORA DE INICIO: 10:35 HORA DE CONCLUSIÓN: 11:32

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Jorge Gonzales	Tecnología	
2	Gustavo Ferrufino	Tecnología	
3	Waldo Rodriguez	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Nancy Patty	Profesional Adquisiciones	

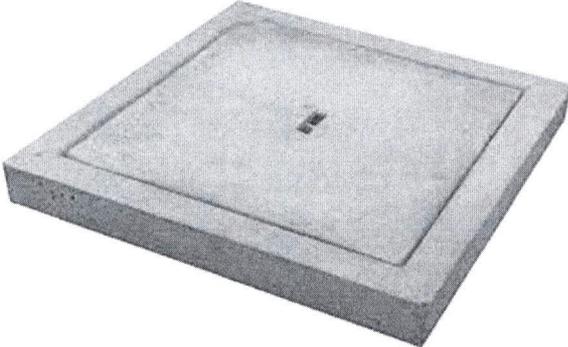
PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	MER TELECOM S.R.L.	Marcelo Gutierrez	70160076- marcelo@merbolivia.com	
2	Abros Technologies S.R.L.	Indira Zapana	75800777- Indira.zapana@abrostec.com	
3	COMBATEL	Edwin Salazar	77572336- 2488757- combatel2008@gmail.com	
4	EMCOSAN S.R.L.	Luis Aliaga	70377444-4534102- emcosan.srl.bol@gmail.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
El Asesor Legal	Aclara y recomienda a los proveedores que deben cumplir a cabalidad con los documentos mencionados y solicitados en el sobre A del TBC. La declaración de Integridad debe ser llenado por el representante y los responsables del proyecto.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Adquisiciones	Recomienda que deben revisar los documentos presentados y cumplir con las características solicitadas. Las empresas nuevas deben tramitar la Certificación en FUNDEMPRESA el registro de vigencia.
1. MER TELECOM S.R.L. ¿La ruta prevista es paralela y está dentro del ámbito del DDV en todo el tramo?	Si está contemplado dentro del derecho de vía (ABC)
2. Se debe considerar abrir sendas, desbroce, o desmalezamiento?	La empresa solo debe hacer desraizado, desmalezado y la canalización.
3. Se debe considerar Estudio de Impacto Ambiental dentro del servicio?	No debe incluir.
4. Por los volúmenes de obra provistos por Entel se entiende que prácticamente todo el tramo iría en ducto enterrado nuevo, por tanto es muy importante el análisis de la ruta paralela a la carretera y del suelo, cuenta Entel con algún documento de análisis previo del suelo y la ruta?	Si ENTEL cuenta con el estudio.
5. Existen cruces de ríos o cursos de agua previstos dentro de la ruta?	Si, existen cursos de agua.
6. En la tabla de Requerimientos Técnicos Especificos en el punto 4.1 se indica: <i>El cable de Fibra óptica norma G.655.C, tipo DD/4200m, ADSS/5000m será proporcionado al Oferente Adjudicado. (El sitio de entrega serán los almacenes de ENTEL S.A. en la población de El Sena.) El Oferente Adjudicado deberá realizar el traslado de las Bobinas a los sitios de instalación.</i> ¿Este servicio de traslado de bobinas se cuantificará conforme a estándar de precios de Entel como un ítem separado o debe estar incluido dentro del servicio?	Tiene que estar incluido en la cotización.
7. En la tabla de Requerimientos Técnicos Especificos en el punto 4.2 se indica: <i>Las bobinas de Tritubo, tapones de Goma, Ball Markers será proporcionado por ENTEL S.A. en los almacenes de la población de El Sena</i> ¿Se debe retirar todo el material de una vez, o será posible hacer retiros parciales conforme sea necesario durante el desarrollo de la obra?	Se acepta ambos casos entregas parciales de acuerdo a avance o el total.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
8. En caso de una nos disponibilidad de materiales en almacén de Entel, ¿sería justificativo para solicitar ampliación de plazo de ejecución?	Si es lo correcto.
9. En la zona de la obra las lluvias son frecuentes y esto tiene una afectación directa a los trabajos de excavación; ¿Se contempla el pago de stand-by de personal y maquinaria en caso de que la obra se deba parar por eventos climatológicos?	No se considera el pago de stand-by de personal y maquinaria.
10. Es posible presentar el registro de lluvias como justificativo para solicitar ampliación de plazo de ejecución?	Si, siempre y cuando se justifique. Esto es considerado como un caso de fuerza mayor.
11. En el Formulario B2 se indica en el ítem 3.2: <i>PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS DE H°A° Y MARCO DE H°A° (0.15x0.40x0,80)</i> Favor indicar si corresponde al siguiente material (ver foto): 	Las dimensiones están correctas y se mantienen las características.
Abros Technologies S.R.L. Solicitan que el tiempo de la ejecución sea a partir de la orden de ENTEL.	Por el tipo de servicio y requerimiento se considerará y se publicará en la página WEB el tiempo del inicio de los trabajos.
COMBATEL: Sin consultas .	
EMCOSAN S.R.L. No existe ítems para áreas de rios y zanjas de relleno compactado en lugares que se hicieron retiros. También la instalación de riendas y crucetas de reserva.	Se analizará y se incluirán estos ítems y se publicará en la página WEB.
En el FORM B2. Existe un error de enumeración	Se corregirá. Se publicará un TBC modificado.
No se consideró el plantado de postes de concreto.	Se tomará en cuenta la instalación de postes ENTEL dispone de postes de concreto y se publicará en la página WEB.
Existe agua estancada.	Si, se considerará este aspecto y se publicará en la página WEB.
